

**ACA asbl**Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiquesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA : BE 0811 407 869

176001482

Ref: 2016090523

RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE / CONTRÔLE PÉRIODIQUE**Données générales**

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Lieu du contrôle: | Rue Bouleau 5 , 5590 CINEY | | |
| Propriétaire: | SUCCESSION BOUCHA | | |
| Client: | Certigreen SPRL Fabien Devillers,RUE DE LA VECQUEE 170, 4100 SERAING | | |
| Type de locaux: | Maison | Distributeur d'énergie: / | |
| Code EAN: | 541 44 | | |
| Installateur: | / | | |
| N° TVA: | / | ou n° carte ID: / | Émis à: / le / |
| Agent-visiteur: | Johnny Onclin | | Date du contrôle: 07/09/2016 |

Type de contrôle

| | |
|---|--|
| Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) | |
| Type contrôle: | Art 271/271bis Contrôle périodique (vente) |
| Info complément.: | Differential plombé |
| Réinspection à: | / |

Données générales de l'installation électrique

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------------|-----------|
| Tension nominale: | 3x400v+N | Courant nominal max: | 40A | Courant nominal sécurité principale: | 25,00 |
| Section du câble d'arrivée: | 4X10 mm² | - Type: | VVB | | |
| Type d'électrode: | Boucle de terre | Section: | / mm² | Conducteur de terre: | 16 mm² |
| Interrupteur différent. général - In: | 40 A | - DI : | 300 mA | Nombre de pôles: | 4 |
| Interrupteur(s) différentiel(s) général(s) extra: / | | | | | |
| Interrupteur différent. second. - In: | 25 A | - DI : | 30 mA | Nombre de pôles: | 4 |
| Interrupteur(s) différentiel(s) secondaire(s) extra: / | | | | | |
| Nombre de circuits: | 16 | Nombre de tableaux: | 1 | Tarif: | Bihoraire |

Mesures et contrôles

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Résistance de dispersion: | 15 Ohm | Protect. contre les contacts indir.: | En ordre | Plombage du différentiel: | En ordre |
| Isolement générale: | 7.8 MOhm | Test du différentiel: | En ordre | Etat du materiel fixe: | Pas en ordre |
| Test de continuité: | Pas en ordre | Test de défaut: | En ordre | Schémas: | / |
| Protect. contre les contacts dir.: | Pas en ordre | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Conclusion : L'INSTALLATION N'EST PAS CONFORME AU RGIE | | L'installation doit de nouveau être contrôlée: avant le: un an après date <input checked="" type="checkbox"/> par le même organisme (*) | |
| NOMBRE D'ANNEXES | Schéma d'implantation: Non Schéma unifilaire: Non Autres: / | L'AGENT-VISITEUR: | Visa du distributeur (art 270) |

Visa de l'organisme de contrôle

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Description des circuits

1 DISJONCTEUR 25A 4P+ 28 FUSIBLES AUTO 16A

CONSTATATIONS: Remarques

- A1 : Les schémas électriques doivent être joints obligatoirement dans le dossier de l'installation électrique. Il est fortement conseillé de joindre une copie de ceux-ci à proximité du coffret électrique principal.
- A3 : Tous les dispositifs de protection au courant différentiel résiduel dans l'installation électrique doivent être testés périodiquement (p.ex. mensuel) en utilisant le bouton test (cfr. les instructions du fabricant).
- AD : Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
- AD2 : Le contrôle effectué est un contrôle instantané basé sur le moment de passage. Ce rapport électrique est uniquement le reflet de l'installation électrique repris au moment de la vérification.
- AE : Le bien est meublé au moment du contrôle.
- AH : Il est conseillé d'obturer correctement et complètement toutes les ouvertures non utilisées de l'installation existante (introduction des câbles, ouvertures dans l'écran de protection,...). (art. 19)
- B : Nous ne pouvons pas exclure le fait qu'au dépôt des schémas, il pourrait y avoir d'autres infractions.
- C : Le contrôle comprend seulement la partie habitable du bien.
- R : Les infractions doivent être éliminées dans le délai cité . La date de rédaction de ce rapport ne vaut pas comme date de demande pour les certificats.
- U : Il faut au moins trois exemplaires des schémas électriques.

CONSTATATIONS: Infractions

Infractions schemas :

- 1.01. : Schéma unifilaire de l'installation est à réaliser ou à compléter. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Schéma de position de l'installation est à réaliser ou à compléter. (art 269)

Infractions mesures :

- 2.04. : La continuité des liaisons équipotentielles et/ou des conducteurs de protection n'est pas garantie. (art 70.05, 85.08)

Infractions coffrets de repartition :

- 4.08. : Obturez les ouvertures non utilisées du tableau ou coffret. (art 19, 49.01, 248)

Infractions interrupteurs différentiels :

- 5.08. : Prévoyez un interrupteur différentiel distinct d'une sensibilité de 30 mA pour l'installation de salles de bains/douches. Cet interrupteur différentiel est inférieure à celui placé à l'origine de l'installation. (art 86.08)
- 5.09. : Prévoyez un interrupteur différentiel distinct d'une sensibilité de 30 mA pour lessiveuse, lave-vaisselle et/ou séchoir et appareils semblables. Cet interrupteur différentiel est inférieure à celui placé à l'origine de l'installation. (art 86.08)

Infractions installation électrique :

- 7.02. : Les règles de l'art ne sont pas appliquées (voir des normes éventuelles, directives du fabricant,...). (art 5, 9)
- 7.04. : Les interrupteurs, les prises et boîtes de branchement doivent être ajustés ou refixés selon les règles de l'art. (art 9.03)

Infractions supplémentaires et/ou explications additionnelles:

2.04 PETITE SDB

70.2 7.04 GARAGE + PETITE SDB



ACA asbl

Organisme de contrôle
agréé
Installations domestiques

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Numéro de TVA: BE 0811 407 869

Ref: 2016090523

ANNEXE – INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Données générales

Annexe à rapport n°: 176001482

Tension nominale: 3x400v+N


Lieu du contrôle: Rue Bouleau 5 , 5590 CINEY

Propriétaire: SUCCESSION BOUCHA

Agent-visiteur: Johnny Onclin

Date du contrôle: 07/09/2016

Schéma d'implantation simplifié (< 01/10/1981) ou photo de l'installation électrique (> ou < 01/10/1981)

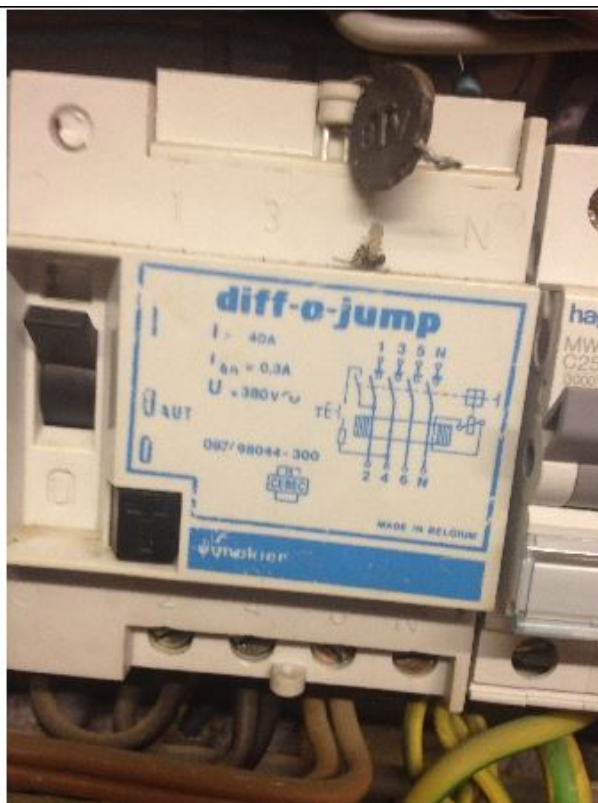

Signature client:

Signature agent-visiteur:
